

ZMLUVA O DIELO číslo 01/2018

uzatvorená podľa § 3 ods. 3 a nasl. zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Obec Podkonice

Sídlo: Podkonice 178, 976 41 Podkonice

Štatutárny orgán: Ing. Michal Vráb, starosta obce

IČO: 00 313 670

DIČ: 2021121344

Bankové spojenie: VUB a.s., Bratislava

Číslo účtu IBAN: SK800200000000017222312

Oprávnené osoby na rokovanie:

vo veciach zmluvných: Ing. Michal Vráb – [redacted], starosta@podkonice.sk

vo veciach technických: Ing. Anna [redacted]

vo veciach technických: Ing. Rudolf [redacted]

(ďalej len „objednávateľ“)

a

1.2. Zhotoviteľ:

Rekstav, s.r.o.

Sídlo: Námestie SNP 147, 976 13 Slovenská Ľupča

Zastúpený: Peter Dula

IČO: 50 451 685

DIČ:

IČ DPH: SK2120326648

Zapísaný v registri: Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, Vložka číslo: 30296/S

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK36 0900 0000 0051 1781 3833

Oprávnené osoby na rokovanie:

vo veciach zmluvných: Peter [redacted]

vo veciach technických: Peter [redacted]

Tel.: [redacted]

E-mail: [redacted]

(ďalej len „objednávateľ“)

II. Predmet zmluvy

- 2.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade s výsledkom postupu zadávania výsledku verejnej obchodnej súťaže predložených v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) podľa § 117 zákona a nasl. zák. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmet zákazky

s názvom „**Chodník pre peších - Podkonice**“. Nehnutelnosti, na ktorých bude dielo zhotovené, sú majetkom obce Podkonice. Jedná sa o chodník vedený vedľa telesa cesty III. triedy 2425, ktorý je rozdelený na úseky:

Úsek 1. Pravostranný chodník od miestnej komunikácie Hôrka po MK po obecným úradom / pozdĺž cesty III/2425

Úsek 2. Ľavostranný chodník od strednej autobusovej zastávky po MK pred Kultúrnym dom / pozdĺž cesty III/2425

Úsek 3. Pravostranný chodník od MK pred obecným úradom po námestie pozdĺž cesty III/2425

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vykoná pre objednávateľa dielo, ktoré je bližšie špecifikované v bode 2.1 tohto článku a objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť v súlade s touto zmluvou, dokončené dielo od zhotoviteľa prebrať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi cenu za dielo podľa tejto zmluvy.

III. Termín zhotovenia diela

3.1 Termín začatia stavby: do 5 kalendárnych dní od prevzatia staveniska.

3.2 Lehota na zhotovenie diela v kalendárnych dňoch: 90 dní.

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi **stavenisko** pre vykonávanie diela najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, a to formou písomného **Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska** podpísaného zástupcami obidvoch zmluvných strán. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v stave spôsobilom na začatie vykonania diela a zároveň odovzdať zhotoviteľovi všetky doklady, písomnosti, dokumentácie, povolenia, vyjadrenia orgánov štátnej správy, t.j. všetky doklady nevyhnutné pre splnenie záväzku zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, ktoré zo svojej podstaty vyplývajú ako povinnosť objednávateľa. V prípade, že objednávateľ neodovzdá ku dňu odovzdania staveniska zhotoviteľovi všetky doklady, zhotoviteľ nie je povinný stavenisko prevziať; je však oprávnený prevziať stavenisko čiastočne. V prípade, že zhotoviteľ prevezme stavenisko čiastočne, uloží objednávateľovi v Protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska lehotu, dokedy mu je objednávateľ povinný dodatočne odovzdať chýbajúce doklady. V prípade, že objednávateľ nedodrží lehotu na odovzdanie chýbajúcich dokladov, konanie objednávateľa bude považované za neposkytnutie súčinnosti zhotoviteľovi.

3.4 Lehota zhotovenia diela sa predlžuje v prípade nepriaznivých klimatických podmienok, ak nie je možné podľa odsúhlaseného harmonogramu výstavby vykonať práce na tých častiach diela, na ktorých technologický postup zhotovenia neumožňuje predmetné časti diela vykonávať, o dobu trvania týchto nepriaznivých klimatických podmienok.

3.5 **Zhotovením diela sa rozumie úplné a riadne vykonanie všetkých stavebných prác bez väd a nedorobkov** vrátane dodávok potrebných materiálov a zariadení nevyhnutných pre riadne dokončenie diela tak, aby bolo dielo funkčné a prevádzkyschopné, ako aj **vykonanie všetkých súvisiacich činností**, a to aj v prípade, ak nie sú osobitne dohodnuté v tejto zmluve, avšak prináležia ku komplexnému zhotoveniu diela, a to:

- a) zabezpečenie a vykonanie všetkých opatrení organizačného a stavebného charakteru k riadnemu vykonaniu diela;
- b) zabezpečenie všetkých prác a dodávok súvisiacich s bezpečnostnými opatreniami na ochranu ľudí a majetku;
- c) zabezpečenie bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia;

- d) zabezpečenie všetkých skúšok a atestov podľa právnych predpisov a technických noriem vzťahujúcich sa k dielu podľa platných právnych predpisov a STN noriem v čase zhotovenia a odovzdania diela, ktorými bude preukázané dosiahnutie predpísanej kvality a predpísaných technických parametrov diela, vrátane zostavenia protokolov;
 - e) zabezpečenie atestov a dokladov o požadovaných vlastnostiach výrobkov;
 - f) odvoz a uloženie vybraných hmôt a stavebnej sute na určenú skládku obcou v katastri obce;
 - g) uvedenie všetkých povrchov dotknutých realizáciou diela do pôvodného stavu (komunikácie, chodníky, zeleň, priekopy, priepusty a pod.);
 - h) vypracovanie technických a ďalších dokumentácií nevyhnutných pre vykonanie diela;
 - i) vykonanie potrebných prehliadok, meraní a skúšok v rozsahu podľa platných právnych predpisov a STN noriem.
- 3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo, ktoré je bližšie špecifikované v tejto zmluve, vykonať:
- a) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť;
 - b) v súlade s touto zmluvou;
 - c) vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác a v kvalite podľa príslušných STN;
 - d) pri dodržaní predpísaných alebo schválených technologických postupov a projektových parametrov, platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných predpisov.

IV. Cena za dielo

- 4.1 Cena za dielo, ktoré je bližšie špecifikované v čl. II. tejto zmluvy, je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách obstarávaní v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách obstarávaní v znení neskorších predpisov. Cena je **pevná a maximálna** a zmeniť jej výšku možno len písomným dodatkom k tejto zmluve, a to za podmienok a v súlade so zák. č. 343/2015 Z.z..

Cena bez DPH: 53 813,02 EUR

Výška DPH: 10 762,60 EUR

Cena s DPH: 64 575,62 EUR.

Zhotoviteľ bude účtovať DPH podľa právnych predpisov platných v čase vyhotovenia vyúčtovania.

- 4.2 Cena za dielo je stanovená na základe **Oceneného výkazu výmer**, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č. 2).
- 4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním ponúknutá cena za dielo bola tvorená podľa výkazu výmeru poskytnutého od zadávateľa vo verejnej obchodnej súťaži. Cena zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny, a že v cene za dielo je obsiahnutý i predpokladaný vývoj cien vstupných nákladov a predpokladané zvýšenie ceny tovarov a prác v závislosti na čase plnenia, a to počas celej doby trvania tejto zmluvy podľa výkazu výmer. V prípade sporu sa má za to, že zhotoviteľ pred podpisom tejto zmluvy získal všetky informácie, ktoré objektívne mohol alebo mal zohľadniť pri stanovení ceny za dielo, že pri stanovení ceny za dielo postupoval s odbornou starostlivosťou a v ponúknutej cene zohľadnil všetky tieto skutočnosti. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny za dielo z akéhokoľvek dôvodu, či už dôvod existoval pred uzavretím tejto zmluvy alebo vznikol po uzavretí tejto zmluvy, či bol spôsobený účastníkom zmluvy alebo tretím subjektom, alebo sa jednalo o udalosť mimo

vplyvu a vôle akéhokoľvek subjektu, okrem prípadov vzniku potreby **naviac prác** v zmysle čl. V. tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa nemôže domáhať zvýšenia ceny za dielo ani v dôsledku vlastných chýb, omylov, opomenutí, nepochopení vecného a kvalitatívneho vymedzenia rozsahu diela alebo chýb jeho subdodávateľov a nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly vykonávania diela. Zhotoviteľ zodpovedá za riadne a včasné zhotovenie diela v dohodnutej cene. Cena za dielo **zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa** spojené so splnením záväzkov podľa tejto zmluvy, t.j. **zahŕňa všetky priame aj nepriame náklady zhotoviteľa spojené s riadnym splnením záväzku zhotoviteľa podľa tejto zmluvy** tak, aby dielo bolo vykonané bez akýchkoľvek väd a nedorobkov a bolo prevádzkyschopné.

- 4.4 V prípade, že niektoré výkony a dodávky zhotoviteľa neboli touto zmluvou dostatočne určené a **nejedná sa o naviac práce** v zmysle čl. V. tejto zmluvy, zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný bez nároku na akékoľvek zvýšenie ceny za dielo vykonať všetky dodávky a výkony, ktoré sú potrebné pre zhotovenie funkčne vyhovujúceho, prevádzkyschopného a bezchybného diela. Zhotoviteľ berie na vedomie, že práce, ktoré vykoná odchyľne od tejto zmluvy alebo bez príkazu objednávateľa (naviac práce v zmysle čl. V. tejto zmluvy), nebudú objednávateľom zhotoviteľovi uhradené.
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať rozhodnutie objednávateľa o **znížení rozsahu diela** v zmysle čl. V. tejto zmluvy tejto zmluvy; v takomto prípade sa znižuje cena za dielo o cenu prác, materiálov, výrobkov a pod., ktoré na základe tohto rozhodnutia objednávateľa nebudú vykonané alebo dodané a boli zahrnuté v cenovej ponuke zhotoviteľa. Rozhodnutie objednávateľa o znížení rozsahu diela podľa tejto zmluvy, musí mať formu písomného dodatku k tejto zmluve, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje takýto dodatok uzatvoriť.

V. Naviac práce a menej práce

- 5.1 **Naviac práce** sú práce, činnosti alebo dodávky, ktoré **nie sú zahrnuté** v tejto zmluve ani v dohodnutej cene za dielo, pričom ich nezahrnutie do ceny za dielo nezavinil zhotoviteľ najmä tým, že pri vypracovaní výkazu výmer ich nezahrnul do tejto ceny, hoci v zmysle tejto zmluvy ich mal do ceny diela zahrnúť. Takýmito naviac prácami sú:
- a) práce, ktoré si objednávateľ objednal dodatočne;
 - b) práce, ktoré musia byť vykonané z oprávnených rozhodnutí orgánov alebo organizácií štátnej správy či samosprávy (v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi predpismi a nejedná sa o práce, ktorých vykonanie bolo nariadené v dôsledku porušenia povinností zo strany zhotoviteľa pri plnení predmetu tejto zmluvy).
- 5.2 V prípade zmeny rozsahu prác, vypracuje zhotoviteľ cenovú ponuku podľa požiadaviek objednávateľa, pričom **pre ocenenie naviac prác** bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo výkaze výmer, bude používať ceny, ktorými zhotoviteľ ocenil jednotlivé položky vo svojej cenovej ponuke;
 - b) pri položkách, ktoré sa nevyskytovali vo výkaze výmer, predloží zhotoviteľ objednávateľovi kalkuláciu ceny.
- 5.3 **Naviac práce** môže zhotoviteľ realizovať len v prípade, ak ich presný rozsah a cena budú dohodnuté v osobitne uzatvorenom písomnom dodatku k tejto zmluve. V prípade ak naviac práce budú vyžadovať aj zmenu času ukončenia diela, je zhotoviteľ povinný do dodatku navrhnúť a zapracovať aj zmenu času ukončenia diela. V prípade ak dodatok nebude obsahovať zmenu časového harmonogramu postupu prác, nevznikne Zhotoviteľovi nárok na posun alebo akúkoľvek úpravu pôvodného časového

harmonogramu postupu prác.

- 5.4 V prípade, ak vznikne potreba naviac prác a od momentu vzniku potreby naviac prác nemôže zhotoviteľ ďalej pokračovať v prácach, pretože bez ich realizácie nie je možné ďalej pokračovať, resp. nie je zrejmé ako má zhotoviteľ ďalej pokračovať, prerušuje sa harmonogram postupu prác uvedený v tejto zmluve o dobu, o ktorú vznikla potreba naviac prác až do momentu účinnosti dodatku k tejto zmluve, v ktorom budú dohodnuté podmienky vykonania naviac prác alebo do momentu, kedy objednávateľ rozhodne o nevykonaní naviac prác a dá pokyn zhotoviteľovi o ďalšom postupe v prácach, a to podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Takýto posun časového harmonogramu prác sa nepovažuje za porušenie povinností zo strany zhotoviteľa a nezakladá právo objednávateľa uplatniť voči zhotoviteľovi sankcie za takýto posun časového harmonogramu prác.
- 5.5 **Menej práce** sú práce, činnosti alebo dodávky, ktoré sú zahrnuté v predmete tejto zmluvy a v dohodnutej cene a:
- a) objednávateľ na ich vykonaní netrvá alebo ich so súhlasom zhotoviteľa vylúčil;
 - b) zhotoviteľ na základe svojich odborných skúseností považuje ich vykonanie za nadbytočné k riadnemu dokončeniu diela;
 - c) nesmú byť vykonané v zmysle rozhodnutí orgánov alebo organizácií štátnej správy, či orgánov samosprávy (v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi predpismi).
- 5.6 V prípade ak došlo k potrebe **menej prác** a zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou práce alebo dodávky materiálov nevykoná, nevzniká zhotoviteľovi nárok na zaplatenie ceny za dielo za takto nevykonané menej práce a zhotoviteľ je povinný tieto menej práce nefakturovať objednávateľovi. Súpis zoznamu menej prác musí byť odsúhlasený oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

VI. Platobné podmienky

- 6.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo podľa čl. IV. tejto zmluvy postupne, na základe čiastkových faktúr a konečnej faktúry vystavenej po zhotovení diela.
- 6.2 Podkladom pre úhradu časti ceny za dielo bude zhotoviteľom vystavená **čiastková faktúra**, ktorá bude vystavená na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác spracovaného overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaných prác pri použití sadzieb uvedených v Ocenenom výkaze výmer (ocenený súpis prác v ponuke zhotoviteľa), v minimálnej výške 20 % z ceny vrátane DPH, čo predstavuje sumu 12.915,12 Eur s DPH.
- 6.3 Po riadnom odovzdaní a prevzatí diela bez väd a nedorobkov, po odovzdaní všetkých dokumentov, revízných správ, certifikátov, návodov na obsluhu a všetkých iných dokladov, ktoré je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi podľa tejto zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený vystaviť objednávateľovi **konečnú faktúru**, ktorou vykoná celkové finančné vysporiadanie ceny za dielo. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany výslovne dohodli na tom, že **v prípade, že v deň odovzdania a prevzatia diela bude dielo vykazovať vady a nedorobky, zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť objednávateľovi konečnú faktúru.**
- 6.4 Zhotoviteľ vystaví faktúry s náležitosťami podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a ďalších súvisiacich platných právnych predpisov SR. Faktúra bude obsahovať tieto údaje:

- a) označenie zhotoviteľa a objednávateľa, adresu sídla, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo faktúry, údaje o zápise zhotoviteľa v obchodnom registri;
- b) číslo zmluvy a označenie diela;
- c) dátum vyhotovenia faktúry, splatnosti faktúry a dátum dodania;
- d) označenie peňažného ústavu a čísla účtu IBAN zhotoviteľa, na ktorý sa má platiť;
- e) celkovú fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných čiastok (vrátane DPH);
- f) pečiatku a podpis oprávnenej osoby.

Faktúra a všetky jej prílohy musia byť potvrdené podpisom a pečiatkou stavebného dozoru.

- 6.5 Splatnosť faktúr je **30 dní** odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Faktúra sa považuje za doručeníu tiež, ak bola osobne prevzatá povereným zamestnancom objednávateľa, ktorý potvrdí jej prijatie svojim podpisom. Objednávateľ uhradí faktúry zhotoviteľovi bezhotovostne - prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že za zaplatenie faktúry sa považuje pripísanie fakturovanej sumy na účet zhotoviteľa.
- 6.6 V prípade chybne vystavenej faktúry je zhotoviteľ povinný nedostatky faktúry odstrániť do 3 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na odstránenie nedostatkov; v takomto prípade začne nová lehota splatnosti faktúry plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.7 Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, vzniká zhotoviteľovi, ktorý si splnil svoje zákonné a zmluvné povinnosti, právo požadovať od objednávateľa z nezaplatenej sumy úroky z omeškania, podľa § 369 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb., v spojení s § 1 ods. 1 a 3 nar. vlády SR č. 21/2013 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, t.j. **vo výške základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania zvýšenej o osem percentuálnych bodov**; takto určená sadzba úrokov z omeškania sa použije počas celej doby omeškania.

VII. Podmienky zhotovenia diela

- 7.1 Zhotoviteľ vykoná technicko-organizačné opatrenia pre zabezpečenie bezpečnosti obyvateľov obce a jej návštevníkov pri vykonávaní prác.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov pracujúcich na zhotovení diela alebo jeho častí. Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu diela dodržiavať podmienky stanovené § 9 zák. č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a podmienky odbornej spôsobilosti pracovníkov zabezpečujúcich činnosti na vyhradených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov.
- 7.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať platné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, pokynmi stavebného dozoru, zápsimi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy a podmienkami dohôd objednávateľa so správcami a vlastníkmi dotknutých inžinierskych sietí.
- 7.4 Zhotoviteľ zabezpečí odstránenie odpadu vznikajúceho pri stavebnej činnosti v zmysle príslušných predpisov a stavebného povolenia a dohody s objednávateľom.
- 7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku.
- 7.6 Zhotoviteľ uvedie priestor okolo staveniska po vykonaní prác do pôvodného stavu v zmysle podmienok stavebného povolenia.

- 7.7 Objednávateľ bude pravidelne osobne a cestou stavebného dozoru kontrolovať spôsob a postup zhotovovania diela a o tomto vykonávať zápisy do stavebného denníka, ktorý je povinný viesť zhotoviteľ diela.
- 7.8 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko minimálne 5 dní pred začatím prác, o čom vykoná zápis do stavebného denníka. Zhotoviteľ vyprace stavenisko do 10 dní po odovzdaní diela.
- 7.9 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne dokončené zhotovené dielo. Zhotoviteľ zápisom do stavebného denníka, a to vopred 3 pracovné dni, oznámi objednávatelovi pripravenosť na odovzdanie diela. Na základe tohto oznámenia objednávateľ určí termín preberacieho konania, ktoré nemôže byť viac ako 10 dní od oznámenia zhotoviteľa o ukončení diela. O odovzdaní a prebratí diela zmluvné strany spíšu protokol.
- 7.10 Zhotoviteľ odovzdá objednávatelovi tri pracovné dni pred odovzdaním diela stavebný denník.
- 7.11 Zhotoviteľ na preberacom konaní diela po ukončení stavebných prác predloží nasledujúce:
- fotodokumentáciu v digitálnej podobe (na CD/DVD) o priebehu realizácie stavebných prác s predmetným popisom;
 - doklady o likvidácii odpadov, ktoré boli likvidované inak ako bolo dohodnuté v zmluve.
- 7.12 Zhotoviteľ je povinný na zabudovaný materiál predložiť dodacie listy a certifikáty zabudovaných výrobkov, ktoré bude predkladať spolu s mesačným zisťovaním a potvrdzovaním objemov skutočne vykonaných prác.
- 7.13 Zhotoviteľ nie je v omeškani s plnením diela v čase, počas ktorého nemohol preukázateľne plniť svoju povinnosť z dôvodov nepriaznivých klimatických podmienok, z dôvodov na strane objednávatel'a alebo z titulu pôsobenia tretej strany majúcej vplyv na vykonávanie a postup prác ako aj vyššej moci, o čom musia zmluvné strany spísať dodatok k tejto zmluve.
- 7.14 Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávatel'a po úspešnom preberacom konaní a na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.15 Zmluvné strany berú na vedomie, že **nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ**, a to až do doby odovzdania diela objednávatel'ovi; prebratím diela prechádza nebezpečenstvo škody za dielo na objednávatel'a.
- 7.16 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré budú počas výstavby uplatnené, ktoré spôsobil svojou činnosťou pri realizácii predmetu diela.
- 7.17 Odovzdaním predmetu tejto zmluvy (diela) v rozsahu čl. II. tejto zmluvy sa rozumie odovzdanie kompletnej dodávky stavebných prác **bez väd a nedorobkov** vrátane príslušných dokladov a dokumentov, o čom sa pri preberacom konaní stavby po ukončení stavebných prác vyhotoví Zápis o odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia obidvoch zmluvných strán.
- Vadou** sa rozumie: každá odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovená projektovými dokumentáciami objednávatel'a vrátane ich prípadných zmien, touto zmluvou, všetkými dokumentmi, ktoré boli podkladom pre uzavretie tejto zmluvy, ako aj všeobecne záväznými technickými normami a právnymi predpismi.

Nedorobkom sa rozumie: nedokončená časť diela (práca) oproti projektovej dokumentácii objednávateľa vrátane ich prípadných zmien, tejto zmluvy a všetkých dokumentov, ktoré boli podkladom pre uzavretie tejto zmluvy.

VIII. Záručná doba, reklamačné podmienky, zmluvné pokuty

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v dobe protokolárneho odovzdania a prevzatia diela objednávateľom a počas záručnej doby bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilý k riadnemu užívaniu.
- 8.2 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi **na dielo záručnú dobu 60 mesiacov a 24 mesiacov na dodané tovary a zabudované výrobky**. Záručná doba začne plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia zhotoveného diela. Predmetom záruky nie sú vady, ktoré vzniknú ako následok živelných pohrôm, spôsobené konaním tretích osôb, vtáctva a hmyzu.
- 8.3 V prípade oprávnenej reklamácie, objednávateľ vzniknutú vadu diela reklamuje písomne, doporučeným listom alebo telefonicky, ihneď po zistení vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje dostaviť sa na reklamačné konanie bezodkladne. Doba vyjadrenia sa k reklamácií je do 3 dní od oznámenia reklamácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť oprávnene reklamované vady do 15 dní od uznania oprávnenej reklamácie. Ak zhotoviteľ vadu uplatnenú v rámci záručnej doby neodstráni v stanovenom alebo dohodnutom termíne podľa tohto bodu a vadu neodstráni ani v dodatočne poskytnutej náhradnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie tejto vady sám, alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 14 dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané práce zaslanej na adresu sídla zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi.
- 8.4 Ak je zhotoviteľ **v omeškaní s odovzdaním diela** podľa tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za každý aj začatý deň omeškania. Toto platí bez ohľadu na právo objednávateľa na náhradu škody, ktorú týmto zhotoviteľ objednávateľovi spôsobil.
- 8.5 Zhotoviteľ je zodpovedný za preukázateľné škody vzniknuté vlastným zavinením.

IX. Ukončenie zmluvy

- 9.1 Táto zmluva sa zrušuje:
 - a) **uplynutím doby**, na ktorú bola táto zmluva uzavretá (viď čl. III. zmluvy);
 - b) **písomnou dohodou účastníkov zmluvy**, pričom táto zmluva sa zrušuje dňom uvedeným v tejto dohode; v tejto dohode sa upravujú tiež vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností, alebo z ich porušenia ku dňu zrušenia tejto zmluvy;
 - c) **písomným odstúpením od tejto zmluvy**; odstúpenie ktorejkoľvek zmluvnej strany od tejto zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane, pokiaľ v ňom výslovne nie je určená iná účinnosť.
- 9.2 Zmluvné strany majú právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch, v ktorých to táto zmluva výslovne stanovuje, a ďalej v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.

- 9.3 Na účely tejto zmluvy sa za **podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom** považuje najmä:
- a) ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, proti zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, príp. počas tohto konania bol proti zhotoviteľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo bol zrušený konkurz z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy je vážne ohrozené;
 - b) zhotoviteľ je v likvidácii;
 - c) zhotoviteľ opakovane (minimálne dvakrát) porušil niektorú zo svojich ďalších povinností podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov;
 - d) ak zamestnanci zhotoviteľa, resp. subdodávateľa zjavným spôsobom porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia, resp. iné dohodnuté povinnosti podľa tejto zmluvy;
 - e) zhotoviteľ, bez uvedenia vážnych dôvodov v zmysle tejto zmluvy nezačne, preruší, alebo zastaví zhotovenie diela;
 - f) zhotoviteľ je viac ako 30 kalendárnych dní v omeškaní so zhotovením diela bez toho, aby táto skutočnosť nastala v dôsledku omeškania objednávateľa alebo v dôsledku vyššej moci;
 - g) ak má dielo vady, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený objednávateľom, ktoré zhotoviteľ napriek upozorneniu objednávateľa neodstránil ani v primeranej, objednávateľom poskytnutej dodatočnej lehote;
 - j) ak je tak uvedené v zákone alebo v tejto zmluve;
 - k) zhotovované dielo nedosahuje základné kvalitatívne a technické parametre podľa podmienok tejto zmluvy a príslušných STN.
- 9.4 Na účely tejto zmluvy sa za **podstatné porušenie tejto zmluvy objednávateľom** považuje omeškanie objednávateľa o viac ako 30 dní s úhradou splatnej časti ceny za dielo.
- 9.5 V prípade **nepodstatného porušenia tejto zmluvy** sú zmluvné strany oprávnené od tejto zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej doby stanovenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na odstránenie konania, ktoré je v rozpore s touto zmluvou a právnymi predpismi, ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 (desať) kalendárnych dní.
- 9.6 V prípade odstúpenia od tejto zmluvy zo strany objednávateľa je zhotoviteľ povinný najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovenia diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy zhotovených častí diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí diela určí objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi zhotoviteľovi, najneskôr však do 7 (siedmich) kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od tejto zmluvy. Aj po ukončení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi požadovanú súčinnosť tak, aby ďalší priebeh zhotovovania diela nebol žiadnym spôsobom dotknutý alebo znemožnený a je povinný písomne upozorniť objednávateľa na všetky nevyhnutné činnosti súvisiace so zhotovením diela, ktoré je potrebné bezodkladne vykonať z dôvodu zachovania hodnoty diela a z dôvodu predchádzania vzniku škôd; v opačnom prípade zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá by mu tým vznikla.
- 9.7 Predčasné ukončenie tejto zmluvy nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady a

nedorobky dovedy vykonaného diela, netýka sa nárokov na zaplatenie zmluvných pokút, zodpovednosti za spôsobené škody a ustanovení tejto zmluvy, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po predčasnom ukončení tejto zmluvy.

- 9.8 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa a podobne) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 3 (troch) kalendárnych dní, odkedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia a čísla účtu zhotoviteľa, pričom k tejto informácii je zhotoviteľ povinný pripojiť aj potvrdenie príslušnej banky.
- 9.9 V prípade odstúpenia od tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný vykonať finančné vyčíslenie vykonaných prác a spracovať „čiastkovú konečnú faktúru“, pričom zhotoviteľovi patrí úhrada za skutočne a riadne vykonané práce. Vykonané práce sa vyúčtujú po odpočte pohľadávok objednávateľa.
- 9.10 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné záväzky vyplývajúce mu z tejto zmluvy a zhotoviteľovi tým znemožňuje vykonanie diela.

X. Záverečné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy nie je v konkurze ani v likvidácii.
- 10.2 Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
- 10.3 Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa počas trvania zmluvy, pričom subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom subdodávateľ začne plniť predmet tejto zmluvy, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa a čestné vyhlásenie zhotoviteľa, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
- 10.4 Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 10.5 Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu dodatku. Len tak sa dodatok stáva súčasťou tejto zmluvy.
- 10.6 V prípade, že sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že bezodkladne neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie nahradia novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej

- miere zodpovedať vôli zmluvných strán v čase uzavretia tejto zmluvy.
- 10.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, túto zmluvu uzatvorili po vzájomnej dohode na základe ich slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určite a zrozumiteľne, túto zmluvu neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, táto zmluva je urobená v predpísanej forme, túto zmluvu si pred jej podpísaním prečítali a na znak súhlasu ju podpísali.
- 10.8 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch s určením: jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa a jedno vyhotovenie pre objednávateľa.
- 10.9 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poslednou zmluvnou stranou a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom stránke objednávateľa.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

Príloha č.1: Grafická situácia osadenie chodníka

Príloha č. 2 Ocenený výkaz výmer z cenovej ponuky zhotoviteľa.

Príloha č. 3: Rozhodnutie Okresného úradu na zvláštne užívanie cesty

Príloha č. 4: Pracovné miesto v obci – použitie dopravných značiek

Príloha č. 5: Oznámenie stavebného úradu o stavebných úpravách a udržiavacích prácach

Príloha č. 6: Vyjadrenie BBRSC na stavebné povolenie

Príloha č. 7: Vyjadrenie okresného úradu o určení dopravných značiek a dopravných zariadení

V Podkoniciach, dňa*18.7.2018*.....

V Podkoniciach dňa*18.7.2018*.....

SITUÁČIA



Stavba : Chodník pre peších - Podkornice

Miesto : PODKORNICE

Rozpočet : Cenová ponuka

Objekt : Časť - práce dodávateľa

JKSO : 822 ex UKP 52 211.p2

Spracoval : REKSTAV P. Dula

Odberaťel: Obec PODKORNICE

97641 PODKORNICE

Dňa : 3.7.2018

Zmluva č.: PC

Dodávateľ: REKSTAV s.r.o Slovenská Lupča

97613 Slovenská Lupča Nám.SNP 147

IČO: 50451685

IČO DPH: SK 2120326648

Projektant:

IČO:

DIČ:

1 M3 OP	64 576	1 M2 UP	64 576
1 M2 ZP	64 576	1 M	64 576
A ZRN	konštrukcie a práce	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV: 53 813,02	6	Práce nadčas
2	PSV:	7	Murárske výpomoco
3	MCE:	8	Bez pevnej podlahy
4	iné:	9	
5	Súčet: 53 813,02	10	Súčet riadkov 6 až 9:
projektant, rozpočítateľ, cenár		dodávateľ, zhotoviteľ	
dátum: _____ podpis: _____		dátum: _____	
pečiatka: _____		podpis: _____	
odberateľ, obstarávateľ		pečiatka: _____	
dátum: _____ podpis: _____		IČO: _____	
pečiatka: _____			
		C	
		NUS - náklady umiestnenia stavby	
		11 Zariadenie staveniska	
		12 Prevádzkové vplyvy	
		13 Sťažnené podmienky	
		14	
		15 Súčet riadkov 11 až 14:	
		D	
		ON - ostatné náklady	
		16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
		17 Inžinierska činnosť	
		18 Projektové práce	
		19	
		20 Súčet riadkov 16 až 19:	
		E	
		Celkové náklady	
		21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 53 813,02	
		22 DPH 20% z: 53 813,02 10 762,60	
		23 DPH 0% z:	
		24 Súčet riadkov 21 až 23: 64 575,62	
		F Odpočet - prípočet	

Odberateľ: Obec PODKONICE

Projektant:

Dodávateľ: REKSTAV s.r.o Slovenská Lupča

Stavba : Chodník pre peších - Podkonice

Objekt : Časť - práce dodávateľa

Prenhľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotk. cena	Konštrukcie a práce	Spolu		Hmotnosť v tonách		DPH %
										Jednotk.	Spolu	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV									
			1 - ZEMNE PRÁCE									
1	001	18120-1102	Úprava pláne zárezov v horn. tr. 1-4 so zhutnením	2 068,200	m2	0,40	827,28	827,28				20
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	827,28			827,28	827,28	0,000			
			2 - ZÁKLADY									
2	001	21590-1101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	1 764,600	m2	0,29	511,73	511,73				
			2 - ZÁKLADY spolu:				511,73	511,73				
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
3	311	45131-3511	Podkladná vrstva z betónu hr. do 10 cm pod dlažbu	563,970	m2	12,40	6 993,23	6 993,23	0,243	137,045	20	
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	6 993,23			6 993,23	6 993,23	137,045			
			5 - KOMUNIKÁCIE									
4	221	56420-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 4 cm	1 194,000	m2	1,59	1 898,46	1 898,46	0,081	96,714	20	
5	221	56485-1111	Podklad zo štrkodrite hr. 150 mm	1 758,000	m2	3,06	5 379,48	5 379,48	0,280	492,240	20	
6	221	56485-1114	Podklad zo štrkodrite hr. 180 mm	2 068,200	m2	3,90	8 065,98	8 065,98	0,334	690,779	20	
7	221	59621-1133	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. C nad 300m2	1 757,970	m2	7,50	13 184,78	13 184,78	0,074	130,090	20	
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	28 528,70			28 528,70	28 528,70	1 409,823			
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
8	221	91656-1111	Osadenie záhon. obrub. betón. do lôžka z betónu tr.C 12/15 s oporou	1 034,100	m	5,40	5 584,14	5 584,14	0,106	109,222	20	
9	221	91776-2111	Osadenie chodník. obrub. betón. ležatého s opor do lôžka z betónu tr.C12/15	331,750	m	8,15	2 703,76	2 703,76	0,176	58,514	20	
10	221	91786-2111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s opor do lôžka z betónu tr.C12/15	702,350	m	7,15	5 021,80	5 021,80	0,136	95,189	20	
11	221	99822-3011	Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený	758,829	t	4,80	3 642,38	3 642,38			20	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	16 952,08			16 952,08	16 952,08	262,925			

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotk. cena	Konštrukcie a práce	Hmotnosť v tonách		DPH %
								Jednotk.	Spolu	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	53 813,02			53 813,02		1 809,792	
			Za rozpočet celkom	53 813,02			53 813,02		1 809,792	

648

Odberteľ: Obec PODKONICE

Projektant:

Dodávateľ: REKSTAV s.r.o Slovenská Lupča

Stavba : Chodník pre peších - Podkonice

Objekt : Časť - práce dodávateľa

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 03.07.2018

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť ton		Súť v tonách	
				Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	827,28	0,00	827,28	0,00000	0,000	0,000	
2 - ZÁKLADY	511,73		511,73				
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	6 993,23	0,00	6 993,23	137,04471	0,000	0,000	
5 - KOMUNIKÁCIE	28 528,70	0,00	28 528,70	1 409,82258	0,000	0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	16 952,08	0,00	16 952,08	262,92520	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	53 813,02	0,00	53 813,02	1 809,79249	0,000	0,000	
Za rozpočet celkom	53 813,02	0,00	53 813,02	1 809,79249	0,000	0,000	



Číslo: OU-BB-OCDPK-2018/020732 Obec Podkonice	
Datum 18. 6. 2018 e	
Podacie číslo: 158/2018	Číslo spisu:
Prílohy/listy:	Vybavuje:

V Banskej Bystrici, dňa 13.06.2018

ROZHODNUTIE

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako správny orgán podľa § 2 ods. 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný cestný správny orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý vykonáva štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy podľa § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. na základe žiadosti od Obce Podkonice, 976 13 Podkonice 178

v y d á v a

podľa § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodnutie, ktorým **povoľuje zvláštne užívanie cesty III/2425** pri dodržaní stanovených podmienok v nasledovnom rozsahu a dobe:

a) úsek cesty:

- cesta III/2425 v úseku od 3,723 ckm do 4,420 ckm v obci Podkonice

b) doba zvláštneho užívania:

- počas vykonávania stavebných prác v termíne do 31.10.2018

c) dôvod zvláštneho užívania:

- manipulácia so stavebným materiálom a pohyb stavebných mechanizmov počas ohlásených stavebných úprav a udržiavacích prác na miestnych komunikáciách - chodníkoch

d) ďalšie podmienky:

1. Žiadateľ je povinný dodržať podmienky uvedené vo vyjadrení správcu cesty Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s. č: BBRSC/03380/2016-BB z 15.07.2016.

2. Prípadné poškodenie cestného telesa cesty III/2425 alebo znečistenie stavebnou činnosťou je povinný žiadateľ bezodkladne odstrániť na vlastné náklady. Taktiež zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú správcovi cesty III/2425 ako aj tretím osobám v súvislosti s realizáciou stavby.
3. Žiadateľ je povinný dodržať podmienky stanoviska okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici č.: ORPZ-BB-ODI1-19-070/2017-ING z 23.05.2017:
 - počas stavebných úprav a udržiavacích prác nedôjde k obmedzeniu dopravy na ceste III/2425 vyžadujúcich čiastočnú uzávierku cesty,
 - začiatok prác oznámiť v dostatočnom časovom predstihu mailom na adresy zdenka.hoferova@minv.sk a slavomir.planieta@minv.sk
 - dopravný inšpektorát si vyhradzuje právo na doplnenie, resp. zmenu stanovených podmienok, pokiaľ si to vyžiada bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný verejný záujem.
4. Po uplynutí doby platnosti rozhodnutia je žiadateľ povinný v prípade pokračovania zvláštneho užívania cesty III/2425 požiadať znovu o vydanie povolenia.
5. Za dodržanie podmienok stanovených v tomto rozhodnutí zodpovedá žiadateľ Obec Podkonice, Podkonice 178, Ing. Stajančová, mail: stajancova@podkonice.sk.

V prípade nesplnenia podmienok tohto rozhodnutia môže byť uložený sankčný postih podľa zákona č. 135/1961 Zb.

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov obce sú od poplatkov oslobodené.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 07.06.2018 bola OÚ BB, odb. CDaPK doručená žiadosť od Obce Podkonice, Podkonice 178 vo veci: „Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie cesty“. Žiadateľ požadoval nový termín povolenia na zvláštne užívanie cesty III/2425. V pôvodnom rozhodnutí cestného správneho orgánu č. OU-BB-OCDPK-2017/017306 z 1.6.2017 bol stanovený termín povolenia do októbra 2017.

OÚ BB, odb. CDaPK ako príslušný cestný správny orgán na základe podanej žiadosti a posúdení nového termínu na zvláštne užívanie cesty povolil podľa § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. v súlade s § 11 ods. 1 písm. c) vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách zvláštne užívanie cesty III/2425 v úseku od 3,723 ckm do 4,420 ckm v obci Podkonice z dôvodu manipulácie so stavebným materiálom a pohybom stavebných mechanizmov počas ohlásených stavebných úprav a udržiavacích prác na miestnych komunikáciách - chodníkoch v rozsahu, dobe a za podmienok stanovených vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov má účastník konania právo podať proti tomuto rozhodnutiu odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica.

Doručí sa:


1. Obec Podkonice, 976 13 Podkonice 178
2. BBRSC a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica

Na vedomie:

3. OR PZ v B. Bystrici, ODI, Okružná 19, 974 99 Banská Bystrica

Mgr. Martin Martinka
vedúci odboru

PRACOVNÉ MIESTO V OBCI

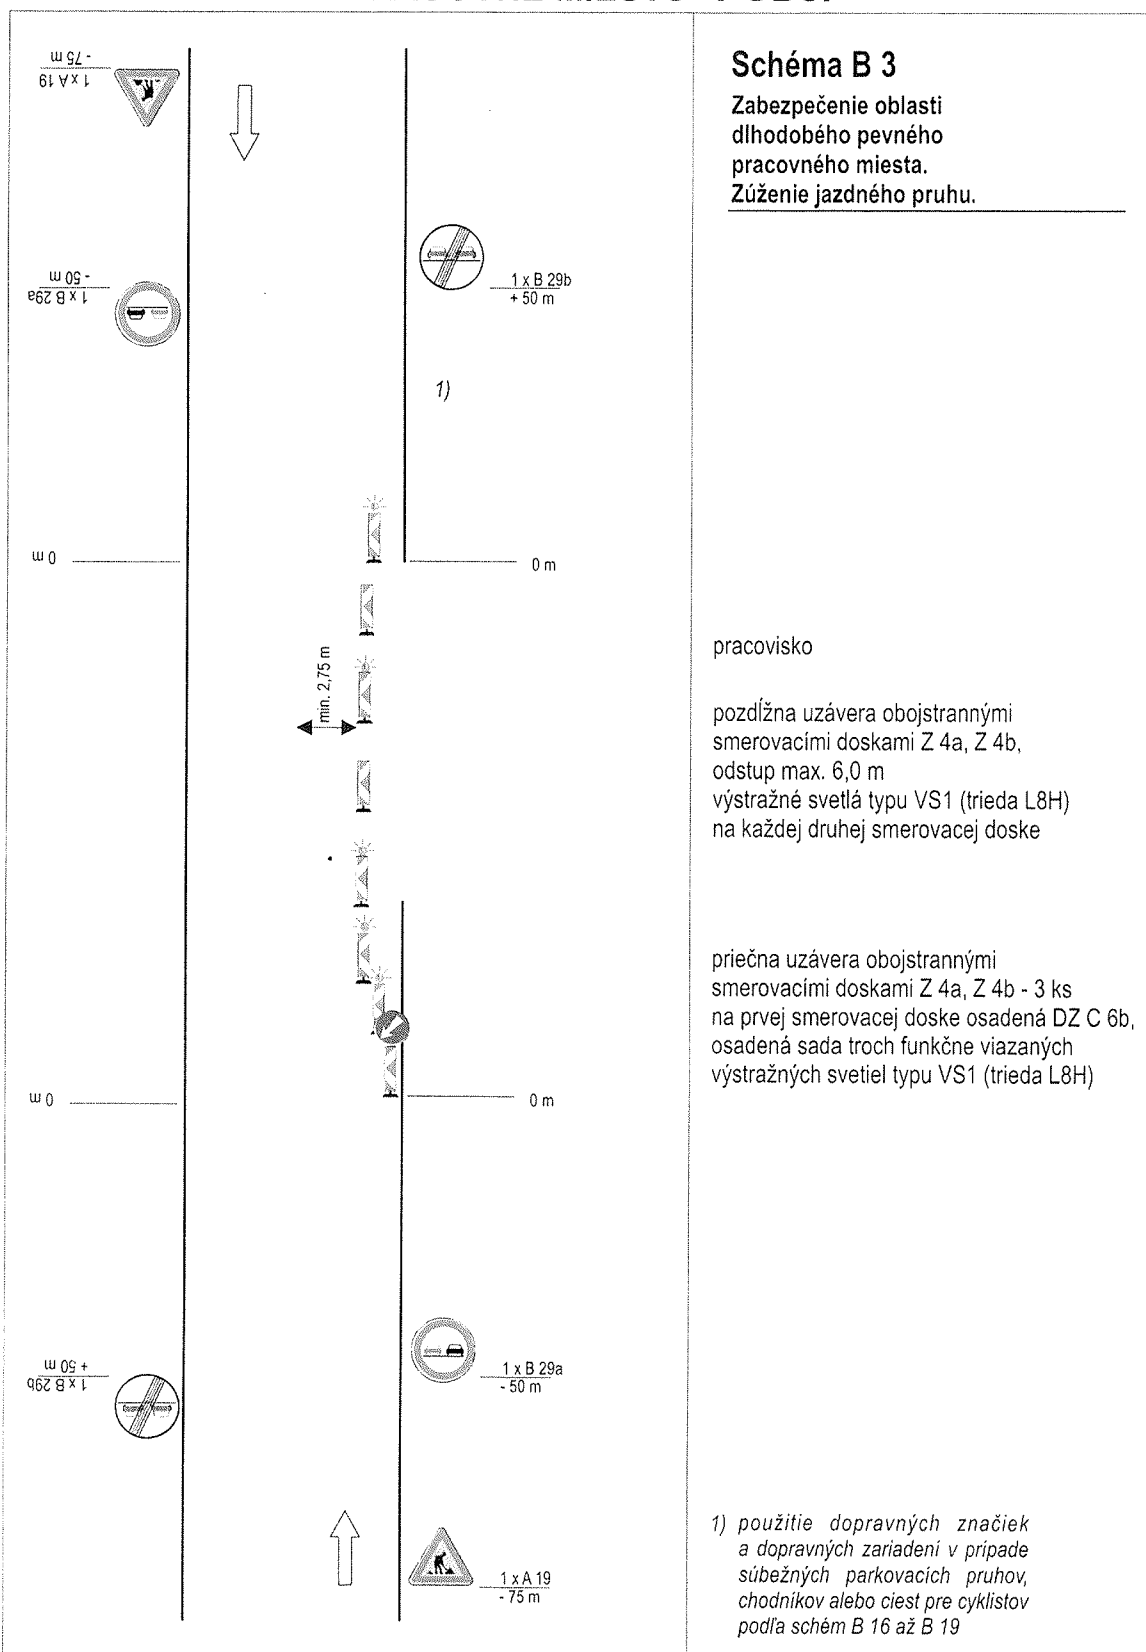


Prenosné zvislé dopravné značky sú základného rozmeru, trieda retroreflexie RA2 podľa STN EN 12899-1. Červené a biele pruhy na smerovacích doskách, na zábranách na označenie uzávierky a na vodiacich tabuliach sú z retroreflexnej fólie triedy RA2 podľa STN EN 12899-1.

OBEC SLOVENSKÁ ĽUPČA
Nám. SNP č.13,976 13 Slovenská Ľupča

Číslo: 977/2016/ME
Ev.č.: 01/2016

V Slovenskej Ľupči, dňa 21.07.2016

Vec: Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác.



OZNÁMENIE

Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici listom zo dňa 10.09.2004 pod č. 2004/3404 určil vo veci konať a vydávať rozhodnutia pre stavebníka obec Podkonice, stavebný úrad - obec Slovenská Ľupča.

I. Stavebník: Obec Podkonice ohlásila špeciálnemu stavebnému úradu pre miestne a účelové komunikácie dňa 08.07.2016 stavebné úpravy a udržiavacie práce na oprave jestvujúcich chodníkov vedľa miestnej komunikácii III/2425 v obci Podkonice, na pozemkoch par. E KN č. 2079/1, 2091/1 v kat. území Podkonice. Stavebník ku konaniu predložil výpisy z KN LV č.1506, ktorým preukazuje vlastnícke právo k pozemkom, na ktorých sú umiestnené chodníky, na ktorých bude vykonávať udržiavacie práce a situačný náčrt.

Obec Slovenská Ľupča, príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie podľa § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 3a ods.4 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, v súčinnosti s § 2 písm.a) ods.3 zákona č.416/201 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky po posúdení predložených podkladov proti uskutočneniu stavebných úprav a udržiavacích prác v rozsahu uvedenom v ohlásení stavebných úprav a udržiavacích prác podľa § 57 ods.2 stavebného zákona

n e m á n á m i e t k y.

II. Účel stavebných úprav a udržiavacích prác: oprava jestvujúcich chodníkov v obci Podkonice, na pozemkoch par. E KN č. 2079/1, 2091/1 v kat. území Podkonice, ktorých vlastníkom podľa LV č. 1506 je obec Podkonice.

III. Rozsah a opis stavebných úprav a udržiavacích prác: výmenu pôvodného povrchu chodníkov za zámkovú dlažbu, včetně uloženia nových obrubníkov. Trasa chodníkov je v súbehu s miestnou komunikáciou III/2425.

IV. Na uskutočnenie stavebných úprav a udržiavacích prác sa určujú tieto podmienky:

1. Stavebné úpravy a udržiavacie práce budú uskutočnené v súlade s ohlásením stavebných a udržiavacích prác situačný náčrt.
2. Prípadne zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho súhlasu špeciálneho stavebného úradu.
3. Pri uskutočňovaní stavebných úprav a udržiavacích práce je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb .
4. Stavebné úpravy a udržiavacie práce budú uskutočňované: dodávateľsky –EUROVIA SK Banská Bystrica, Partizánska cesta 118/A, Banská Bystrica
5. Dokončenie stavebných a udržiavacích prác do: 12/2018

6. Dokončenie stavebných úprav a udržiavacích prác stavebník oznámi špeciálnemu stavebnému úradu a k oznámeniu doloží doklad o zhodnotení a zneškodnení odpadov zo stavebných úprav a udržiavacích prác

Oznámenie špeciálneho stavebného úradu podľa § 57 ods. 5 stavebného zákona nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov, vrátane povinnosti dodržať pri uskutočňovaní a užívaní stavby príslušné slovenské technické normy.

Stavebník je oslobodený od správnych poplatkov podľa zákona č.439/2012Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Ing. Miroslav Macák
starosta obce

Príloha pre stavebníka: 1 x overená zjednodušená dokumentácia

Doručí sa:

1. Obec Podkonice, Podkonice 178


Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Informatívna kópia z mapy

Vytvorené cez katastrálny portál


Okres: Banská Bystrica
Obec: PODKONICE
Katastrálne územie: Podkonice

23. júna 2016 9:41

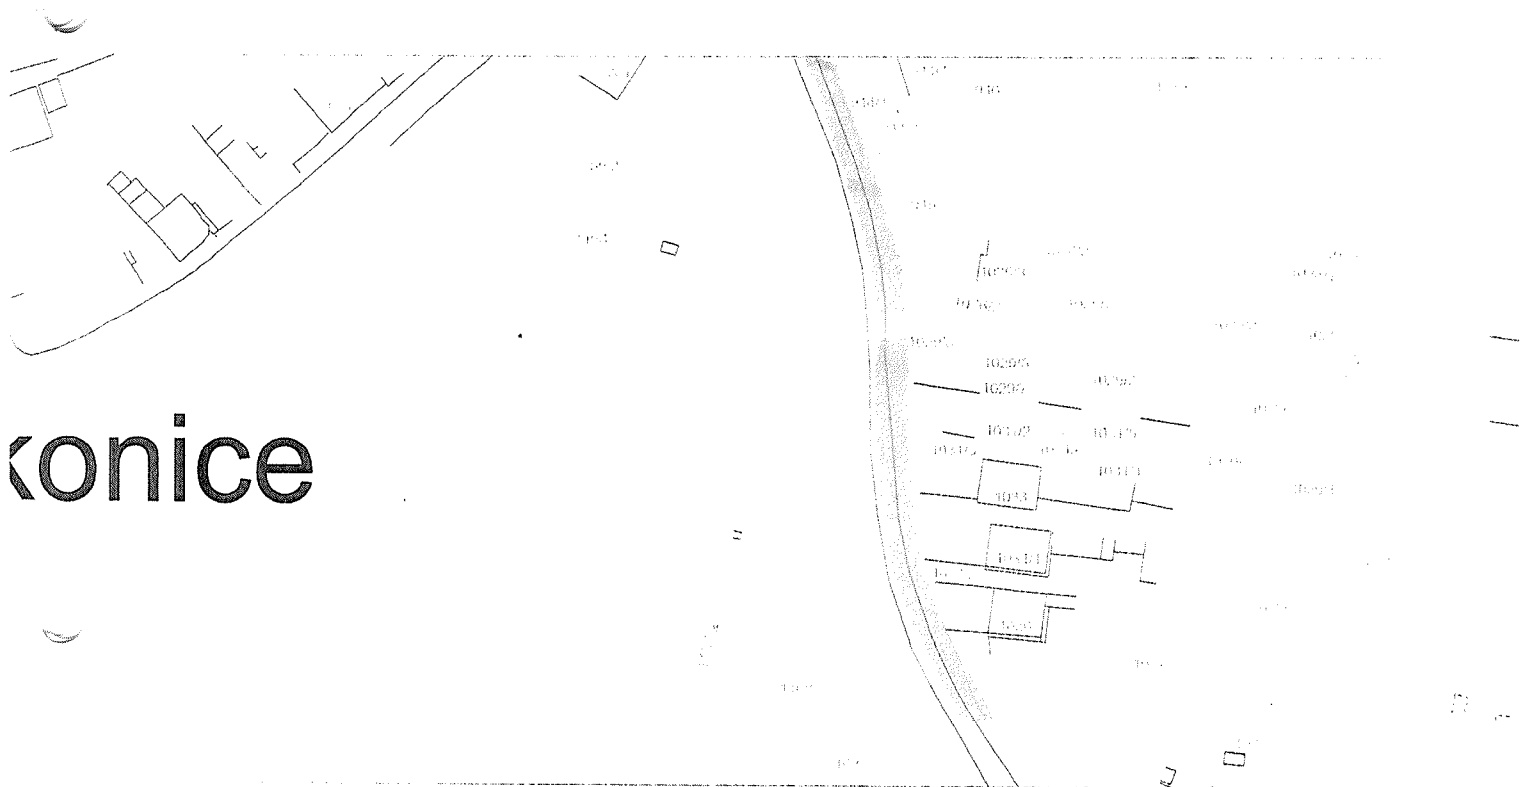

konice

SCALE 1 : 1 536



Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Informatívna kópia z mapy


Vytvorené cez katastrálny portál

Okres: Banská Bystrica
Obec: PODKONICE
Katastrálne územie: Podkonice

23. júna 2016 9:41



SCALE 1 : 1 536




Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Informatívna kópia z mapy



Vytvorené cez katastrálny portál

Okres: Banská Bystrica
Obec: PODKONICE
Katastrálne územie: Podkonice

23. júna 2016 9:43

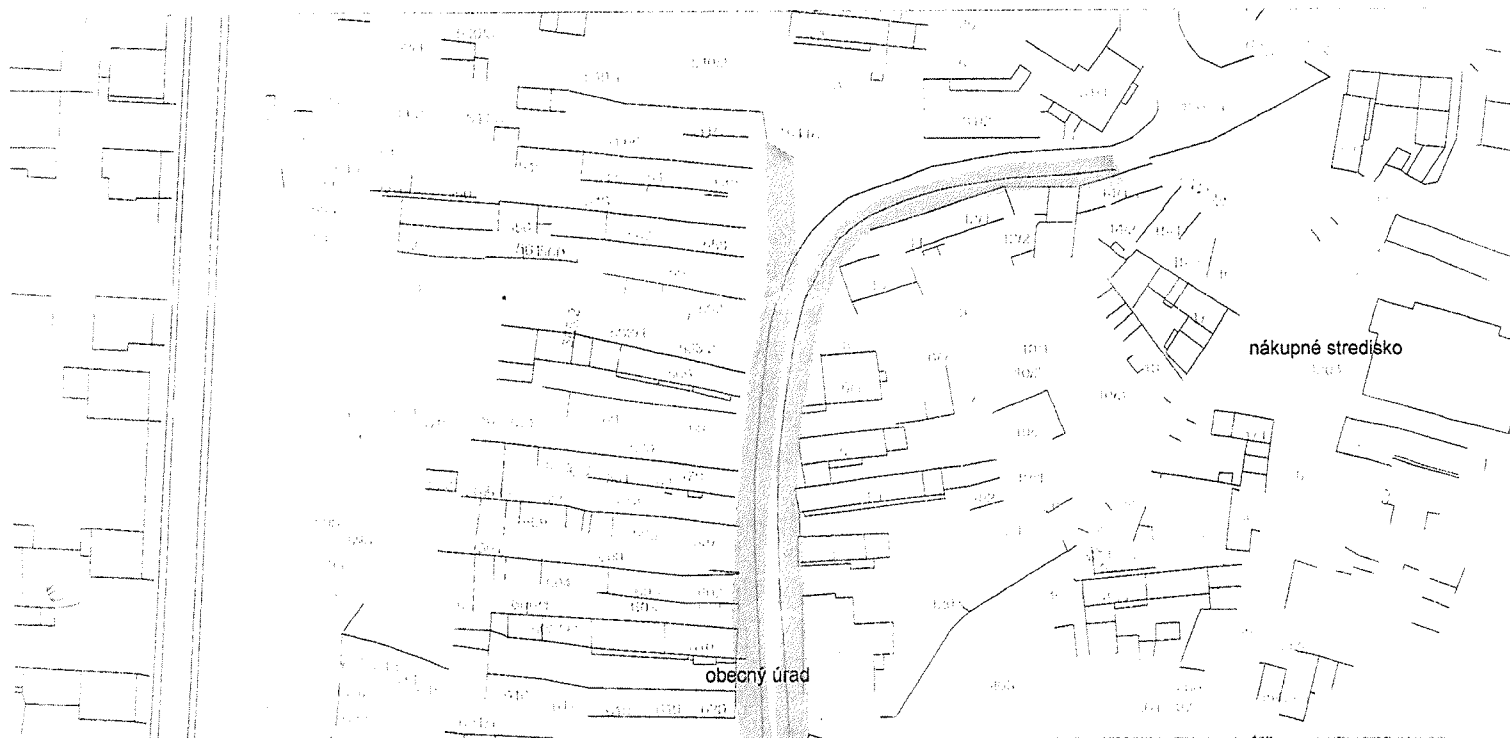

SCALE 1 : 1 536





Dátum

Podľa

Príloh

Obec Podkoc
976 41 Podkoc

Váš list číslo/zo dňa
08.07.2016

Naše číslo
BBRSC/03380/2016-BB

Vybavuje/linka
Ing. Halajová/4723906

Banská Bystrica
15.07.2016

Vec : **Podkonice – oprava chodníkov**
- vyjadrenie na stavebné povolenie

Dňa 11.07.2016 bola našej spoločnosti doručená žiadosť o vyjadrenie k projektu „Podkonice – oprava chodníkov“ pre potreby stavebného konania.

Stavba rieši opravu jestvujúcich chodníkov v obci, hlavne okolo cesty III/2425. Obrubníky chodníkov zú v značnej miere poškodené a chodníky nevyhovujú platným EN a STN. Nové betónové obrubníky budú osadené do bet. lôžka so zachovaním pôvodnej trasy, asfaltové plochy chodníkov budú nahradené betónovou dlažbou. V miestach vjazdov budú obrubníky zapustené do nivelety vozovky, a nábehy budú robené spádovanou dlažbou v š. 60 cm v rámci chodníka. Chodníky sú navrhnuté v 2% sklone k ceste. Šírka vozovky cesty, ako aj šírka chodníkov zostane zachovaná pôvodná.

Podľa prehlásenia žiadateľa oprava chodníkov bude zrealizovaná pred opravou krytu vozovky cesty III/2425.

Oprava chodníkov je rozčlenená na 5 úsekov, z toho cesty III/2425 sa tieto úseky dotýkajú nasledovne:

Úsek 1. Pravostranný chodník od miestnej komunikácie Hôrka po MK pred obecným úradom /dĺžka 553 m/ sa cesty dotkne v ckm 3,723 - 4,276

-Ckm 3,723 – 4,220 – v dĺžke 497 m na ktorom bude 33 vjazdov

-Ckm 3,982 – 4,048 – v dĺžke 66m, v rámci stavby bude vybudovaný ľavostranný odvodňovací rigol z betónových žľaboviek do betónového. lôžka.

Úsek 2. Ľavostranný chodník od strednej autobusovej zastávky po MK pred hornou zastávkou /dĺžka 240 m/ sa cesty dotkne v ckm 4,124 – 4,364

-Ckm 4,124 – 4,341 – v dĺžke 217 m na ktorom bude 19 vjazdov

Úsek 3. Novonavrnutý chodník od hornej zastávky popred kultúrny dom v dĺžke 36 m – ckm 4,372 – 4,408

Úsek 4. Pravostranný chodník od MK pred obecným úradom po námestie v dĺžke 171 m – ckm 4,249 – 4,420 na ktorom bude 6 vjazdov

Úsek 5 miestna komunikácia v dĺžke 143m- ckm 4,276-4,419

Z hľadiska správy a údržby ciest II. a III. triedy, vlastníkom ktorých je Banskobystrický samosprávny kraj a správcom Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Banská Bystrica, (ďalej len BBRSC), Vám dávame nasledovné stanovisko:

S realizáciou stavby a zvláštnym užívaním cesty III/2425 počas realizácie opravy chodníkov **súhlasíme** za splnenia nasledovných podmienok:

- Realizácia prác v telese cesty podlieha povoleniu na zvláštne užívanie cesty od Okresného úradu v Banskej Bystrici, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len OÚ OCDPK).

- Nakoľko oprava cesty III/2425, ktorú pripravuje BBRSC, bude realizovaná zosilením asfaltových vrstiev, t.j. položením obrusnej vrstvy v hrúbke 50 mm na súčasnú niveletu vozovky, **požadujeme obrubníky osadiť do 120 + cca 50 mm nad niveletu súčasnej vozovky.**
- Osadenie obrubníkov musí byť zrealizované do začatia realizácie opravy cesty čo predpokladáme po 15. 09.2016.
- Pri poškodení vozovky pri osadení obrubníkov doplniť konštrukciu vozovky podľa nižšie uvedených požiadaviek.

Technické podmienky realizácie

Vozovka

- okraj vozovky na hrúbku asfaltových vrstiev zapíliť v celom úseku navrhovaného chodníka a to pre osadenie obrubníka a možnosť zhutnenia s min. možným zásahom do šírky jazdného pruhu;
- hranu vozovky pred položením nových asfaltových vrstiev natrieť spojivom,

Konštrukcia vozovky

- podložie na celej ploche rozšírenia vozovky zasýpať štrkodrvou frakcie 0 – 32 po 20 cm vrstvách s postupným zhutňovaním, posledná ochranná vrstva musí byť zhutnená min. na $E_{def2} = 100$ MPa,
- podkladová vrstva 1 x 150 mm z CBGM
- asfaltový infiltračný postrek PI, 1,0 kg/m²
- ložná vrstva 1 x 70 mm z **AC_L 16, do nivelety súčasnej vozovky**

Požiadavky na kvalitu prác pri zásahu do vozovky

- počas zhutňovacích prác je potrebné ku kontrole prizvať vedúceho strediska Lučatín (p. Bercík, č. t. 0905421496), požadujeme osobnú účasť nášho pracovníka aj pri skúškach zhutnenia,
- stavebné práce musia byť realizované prostredníctvom oprávnenej firmy,
- certifikáty zabudovaných stavebných materiálov, asfaltovej zmesi a protokol zo skúšok hutnenia, ktorých výsledky sú podkladom na preberanie prác, je potrebné predložiť BBRSC a.s. najneskôr v deň zápisničného odovzdávania,

Všeobecné podmienky a doprava

- chodník budovať po úsekoch dlhých max. 50 m
- práce zorganizovať tak, aby zostal voľný jeden jazdný pruh pre striedavé obojsmerné vedenie cestnej premávky,
- práce v dotyku s cestou nie je možné realizovať v období výkonu zimnej údržby, t.j. od 1.11. do 31.03. príslušného kalendárneho roka,
- stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovaniu dotknutej pozemnej komunikácie,
- mechanizmy nesmú pri prácach zbytočne stáť na ceste a obmedzovať plynulosť cestnej premávky,
- pred začatím prác požiadať o vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí,
- začatie a ukončenie prác musí byť písomne (aj mailom na alena.barlova@bbrsc.sk) nahlásené min. 3 dni vopred zodpovednému zástupcovi BBRSC a.s., oblasť Banská Bystrica, (vedúci strediska Lučatín p. Bercík, č.t. 0905421496)
- po ukončení prác je potrebné dotknutý úsek cesty uviesť do požadovaného stavu a **zápisnične preberacím protokolom** odovzdať do 3 pracovných dní zodpovednému zástupcovi BBRSC, a.s. oblasť Banská Bystrica,
- na zrealizovaný zásah do cestného telesa a následnú stavebnú úpravu cesty požadujeme od investora **záručnú dobu 60 mesiacov** odo dňa zápisničného prevzatia vykonaných prác,
- žiadateľ na vlastné náklady zabezpečí dotknutý úsek dočasným dopravným značením určeným OÚ OCDPK v Banskej Bystrici, ktoré odsúhlasí OR PZ – ODI v Banskej Bystrici,

- žiadateľ na vlastné náklady zabezpečí dotknutý úsek dočasným dopravným značením určeným OÚ OCDPK v Banskej Bystrici, ktoré odsúhlasí OR PZ – ODI v Banskej Bystrici,
- v prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správne mu orgánu a správcovi cesty,
- v plnej miere žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon),
- stavbu je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, ktorým je Okresný úrad v Banskej Bystrici, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií .

BBRSC, a.s. ako správca dotknutej pozemnej komunikácie si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právo podmienky k realizácii stavby, ak si to vyžiada verejný záujem doplniť alebo zmeniť.

S pozdravom

Peter Bobrík
vedúci technického úseku

Na vedomie:

- BBSK, OISMD, Námestie SNP 23, Banská Bystrica - scan
- OÚ Banská Bystrica, OCDPK, nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica - scan
- ORPZ - ODI, Okružná 19, Banská Bystrica - scan
- BBRSC, a. s., oblasť Banská Bystrica, Majerská cesta 94, stredisko Banská Bystrica

OKRESNÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Nám. L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

Obec Podkonice
Podkonice 178
976 13 Podkonice

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

OU-BB-OCDPK-2018/020730

Vybavuje/linka

Ing. Eva Mikušková/4306263

Banská Bystrica

13.06.2018

Vec

Určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako správny orgán podľa § 2 ods. 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný cestný správny orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý určuje použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na cestách II. a III. triedy, po posúdení žiadosti od Obce Podkonice, Podkonice 178

u r č u j e

podľa § 3 ods. 5 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb. v súlade s § 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. so súhlasom okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici **použitie prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení** počas odstraňovania stromov a krovín ohrozujúcich bezpečnosť cestnej premávky za nižšie uvedených podmienok:

a) druh dopravných značiek a dopravných zariadení:

- podľa priloženej schémy B 3 Technických podmienok MDV SR pre pracovné miesto v obci

b) umiestnenie dopravných značiek a dopravných zariadení:

- na ceste III/2425 v úseku od 3,723 ckm do 4,420 ckm v obci Podkonice. Prenosné dopravné značenie bude posúvané podľa postupu stavebných úprav a udržiavacích prác na miestnych komunikáciách – chodníkoch počas ich rekonštrukcie

c) časové obdobie umiestnenia prenosného dopravného značenia:

- od 01.07. do 31.10.2018 počas obmedzenia cestnej premávky

d) ďalšie podmienky:

1. Vyobrazenie, farby, vyhotovenie a umiestnenie dopravných značiek a dopravných zariadení musí zodpovedať zákonu NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o



OKRESNÝ
ÚRAD
BANSKÁ BYSTRICA

Telefón
048/ 4306263

Fax
048/ 4136114

E-mail
eva.mikuskoval@minv.sk

Internet
www.minv.sk

IČO

zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Určené dopravné značenie musí byť umiestnené tak, aby bolo účastníkmi cestnej premávky včas a zreteľne viditeľné.
3. V prípade, že prenosné dopravné značenie bude v niektorom úseku pozemnej komunikácie v rozpore s trvalými dopravnými značkami, je potrebné trvalé dopravné značky prekryť vhodným spôsobom.
4. Žiadateľ je povinný dodržať v plnom rozsahu podmienky okresného dopravného inšpektorátu, OR PZ v Banskej Bystrici určené v stanovisku číslo: ORPZ-BB-ODI1-10-077/2017-ING z 23.05.2017.
5. Určené prenosné dopravné značky a dopravné zariadenia zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady. Umiestnenie prenosných dopravných značiek a zariadení bude zrealizované oprávnenou fyzickou alebo právnickou osobou a odstránené po skončení obmedzenia cestnej premávky z dôvodu zvláštneho užívania cesty III/2425.
6. Za dodržanie uvedených podmienok zodpovedá žiadateľ Obec Podkonice, Podkonice 178, Ing. Stajančová, mail: stajancova@podkonice.sk.

Poučenie

Podľa § 3 ods. 6 zákon č. 135/1961 Zb. sa na určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

Prilohy

1. Schéma prenosného dopravného značenia

Na vedomie

1. OR PZ v Banskej Bystrici, ODI, Okružná 19, 974 04 Banská Bystrica

Mgr. Martin Martinka
vedúci odboru
